

추진부서(팀)	토목팀	이행도	완료
---------	-----	-----	----

## □ 사업개요

- 위 치 : 정선군 신동읍 방제리(새비재 일원)
- 도로분류 : 농어촌도로 208호
- 사업량 : 아스콘 덧씌우기 및 선형개량 L= 120m
- 총사업비 : 300백만원(군비)
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 12월

## □ 추진현황

- 2018. 11. : 측량 및 설계 완료
- 2019. 04. : 사업 착공
- 2019. 12. : 사업 준공

## □ 문제점 및 대응방안


- 해당사항 없음

## □ 향후 추진계획

- 해당사항 없음

## 사업대상지 위치도 및 전경

### ○ 위치도

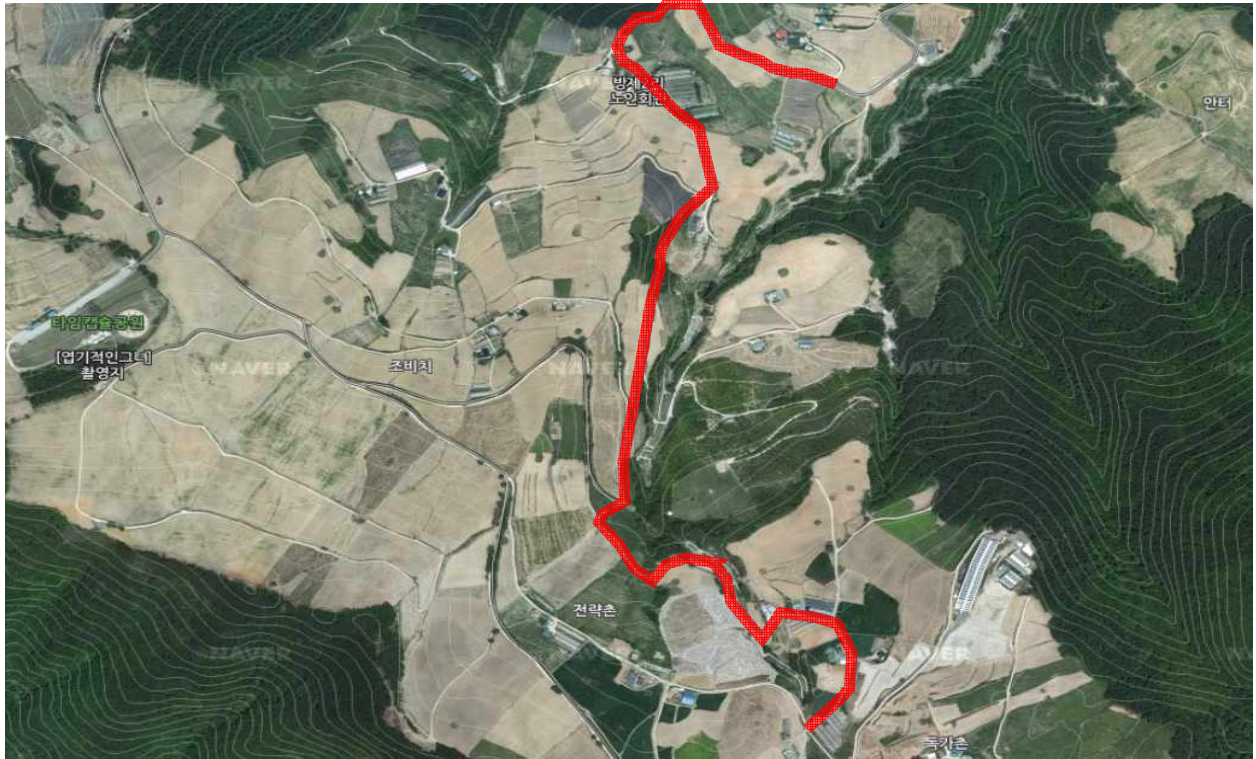

### ○ 전경사진

