

추진부서(팀)	토 목	이행도	완 료
---------	-----	-----	-----

□ 사업개요

- 위 치 : 신동읍 방제리(새비재) 일원
- 도로분류 : 농어촌도로 208호
- 사 업 량 : 확·포장 L=117m(B=6.0m), 기타부대공 1식
- 총사업비 : 310백만원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년(2년)

□ 추진현황

- 공사 구간 현황측량 : 2018. 10월
- 공사 착공 : 2019. 04월
- 공사 준공 : 2019. 12월


□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	310	-	10	300	-	-	-
군 비	310	-	10	300	-	-	-

사업대상지 위치도 및 전경

○ 위치도

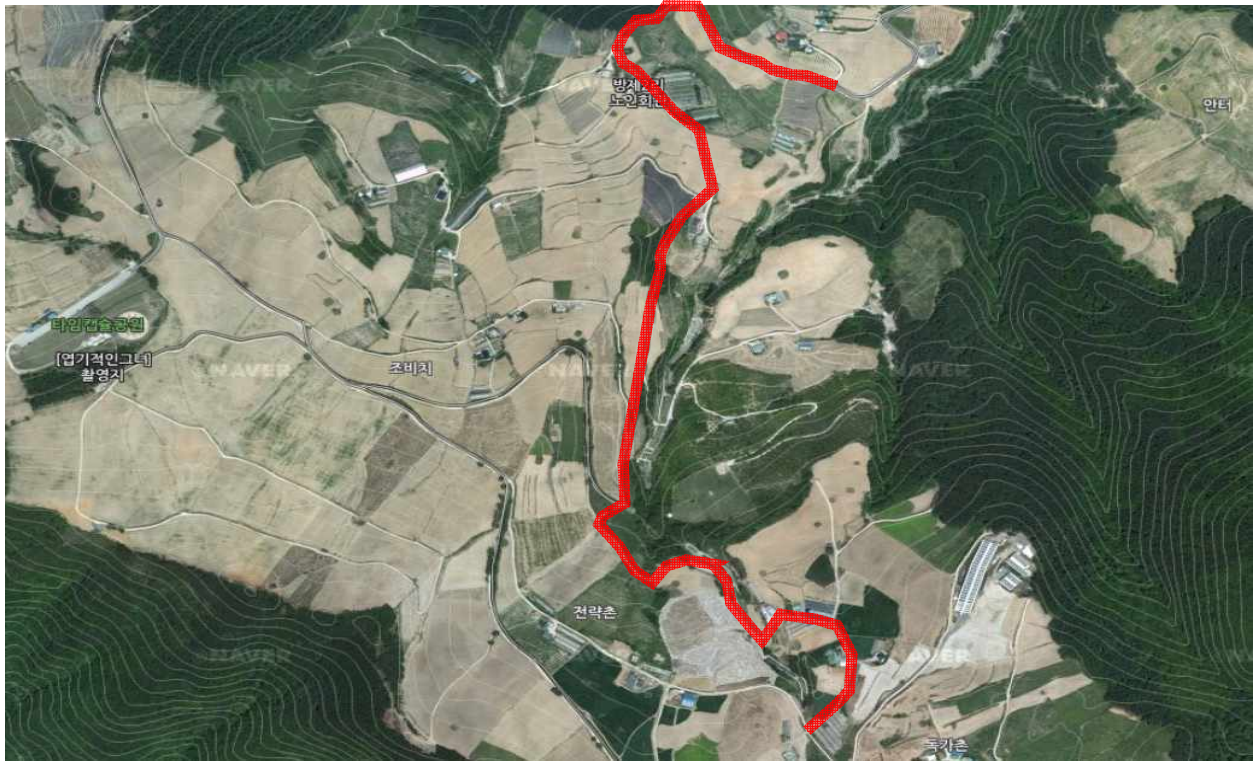

○ 전경사진

