

추진부서(팀)	보건소(보건행정팀)	이행도	정상추진
---------	------------	-----	------

□ 사업개요

- (사업위치) 정선군 사북읍 지장천로 727
- (사업량) 총 연면적 A=4,049,5m²
- (사업비) 15,700백만원(군비 600, 폐기금 15,100)
- (사업기간) 2020년 ~ 2022년(2023. 1월 개원)
- (사업내용) 군립병원 병동(1동) 및 부속시설(2동) 신축

□ 추진현황


- 재단법인 정선의료재단 설립('19. 12. 23.)
 - ▶ 정선의료재단 조직 및 규정기준 마련 컨설팅 연구용역 완료
 - ▶ 군립병원 정상화를 위한 직원채용 : 50명('20. 6.)
- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 설계용역 : 564백만원
 - ▶ 업체선정 및 계약체결

계약상대자	소재지	대표자	주요경력
(주)에이치앤케이 종합건축사사무소	서울시 강남구 강남대로 310	홍 승 섭	1. 서충주 신도시도서관 건립 2. 진천군 농업기술센터 신축 3. 서울시 마포구 요양병원 신축

※ 병동 및 부속시설 신축 기본계획 확정

구분	내용	면적	비고
합계		4,049.5m ²	
지하1층	PIT	-	기계/전기실
지상1층	응급실, 영상의학과, 로비, 원무과 정형외과, 약국 등	1,200m ²	병상은 기존 신관동 활용
지상2층	외래(내과, 외과, 소아청소년과, 산부인 과), 물리치료실, 건강검진센터	1,780m ²	
부속시설	의료인(의사, 간호사) 관사	1,069.5m ²	

※ 현장사진 및 조감도

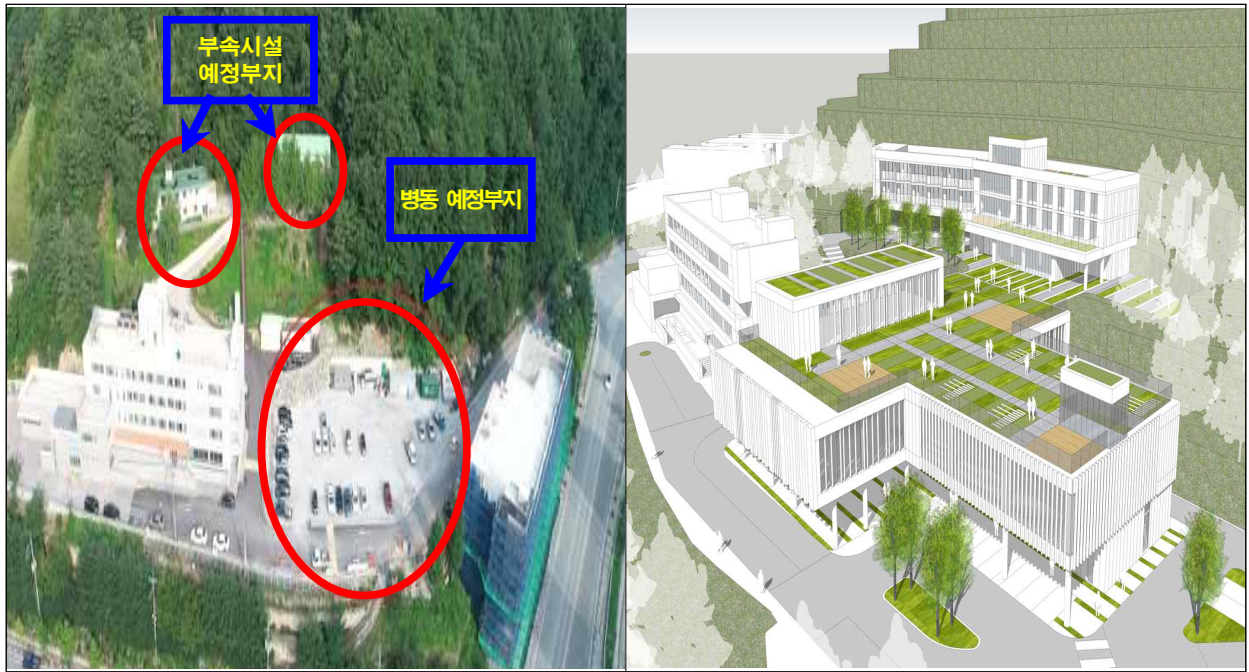

○ 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 부지조성

- ▶ (사업비) 1,400백만원
- ▶ (사업내용) 토공(흙깎기, 사토, 땅깎기), 보강토 옹벽 설치, 비탈면 녹화 등

※ 사업기간 : 2020. 6. 16. ~ 12. 12.

공종별	공사내용	완료사항	비 고
토공	건물철거	2개동 철거(완료)	공정률 80%
	흙깎기 및 사토	11,047m³ 중 9,344m³	
	녹생토	38m(완료)	
	식생토낭	85m³(완료)	
비탈면 보강공	소일네일링	180공 중 160공	
	조경석 쌓기	119m(완료)	
	L형 측구 및 맹암거	완료	
배수공	소단측구	120m(완료)	
부대공	액화산소탱크철거	1개 철거	

□ 문제점 및 대응방안

- (문제점) ① 군립병원 신축 및 의료장비 구입예산 미확보 : 13,400백만원
 - ※ 강원랜드 영업중단으로 인한 폐광기금 감소로 재원확보 차질 우려
 - ② 의사, 간호사 등 병원 운영에 필요한 의료인력 부족
- (대응방안) ① 신축예산 군비부담 가중에 따른 국비지원 방안 강구
 - ② 의료서비스 질 향상을 위해 채용절차를 통한 의료인력 충원

□ 추진계획

- 재단법인 정선의료재단 운영규정 정비 및 인력채용
 - ▶ 병원의 원활한 운영을 위한 직원 상시채용
 - 2021년 예상 현원 55명 ⇨ 70명으로 15명 증원 계획
 - 지역특성상 의료인력의 절대적 부족으로 인해 간호사 상시 채용
 - ▶ 직원 급여체계 개편을 통한 처우개선
 - 상여금, 복지포인트 지급 등 2021년 예산편성 시 반영 예정
 - ▶ 정선의료재단 규정집 일부 또는 전부개정 : 2020. 11월 초
 - 복무규정, 보수규정, 직인규정 등 개정
- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 설계용역 완료 : 2020. 12월
- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 부지조성 완료 : 2020. 12월
- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 공사착공 : 2021. 상반기

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,700	0	0	0	2,300	12,400	1,000
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	600	0	0	0	600	0	0
폐기금	15,100	0	0	0	1,700	12,400	1,000
