

## 2-6

# 정선군립병원 운영 정상화

추진부서(팀)	보건소(보건행정팀)	이행도	정상추진
---------	------------	-----	------

### □ 사업개요

- (사업위치) 정선군 사북읍 지장천로 727
- (사업량) 총 연면적 A=4,049.5m<sup>2</sup>
- (사업비) 15,700백만원(군비 600, 폐기금 15,100)
- (사업기간) 2020년 ~ 2022년(2023. 1월 개원)
- (사업내용) 군립병원 병동(1동) 및 부속시설(2동) 신축

### □ 추진현황


- 재단법인 정선의료재단 설립('19. 12. 23.)
  - ▶ 정선의료재단 조직 및 규정기준 마련 컨설팅 연구용역 완료
  - ▶ 군립병원 정상화를 위한 직원채용 : 72명('20. 12.)
- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 설계용역 : 630백만원
  - ▶ 용역기간 : 2020. 07. 01. ~ 2021. 2. 27.(설계용역 진행 중)
  - ▶ 업체선정 및 계약체결

계약상대자	소재지	대표자	주요경력
(주)에이치앤케이 종합건축사사무소	서울시 강남구 강남대로 310	홍 승 섭	1. 서충주 신도시도서관 건립 2. 진천군 농업기술센터 신축 3. 서울시 마포구 요양병원 신축

#### ※ 병동 및 부속시설 신축 기본계획

구분	내용	면적	비고
합계		4,049.5m <sup>2</sup>	
지하1층	PIT	-	기계/전기실
지상1층	응급실, 영상의학과, 로비, 원무과 정형외과, 약국 등	1,200m <sup>2</sup>	병상은 기존 신관동 활용
지상2층	외래(내과, 외과, 소아청소년과, 산부인과), 물리치료실, 건강검진센터	1,780m <sup>2</sup>	
부속시설	의료인(의사, 간호사) 관사	1,069.5m <sup>2</sup>	

※ 현장사진 및 조감도

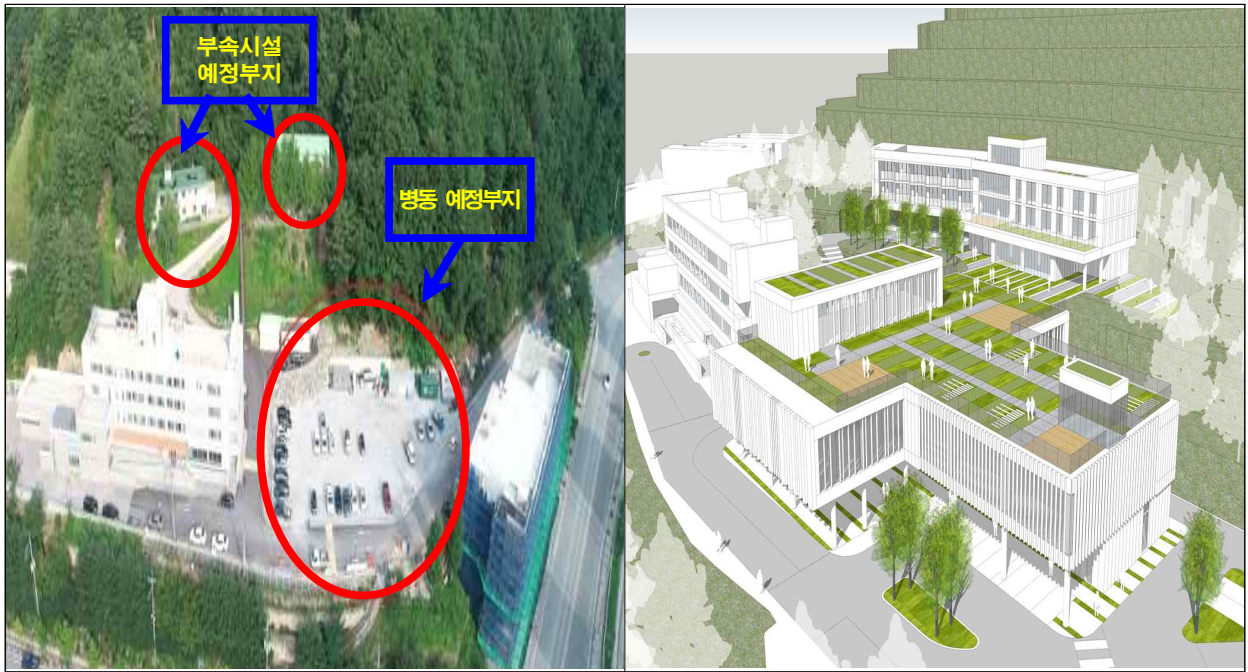

○ 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 부지조성 완료

- ▶ (사업비) 1,400백만원
  - ▶ (사업내용) 토공(흙깎기, 사토, 땅깎기), 보강토 옹벽 설치, 비탈면 녹화 등
- ※ 사업기간 : 2020. 06. 16. ~ 12. 12.



## □ 문제점 및 대응방안

- (문제점) 군립병원 신축을 위한 소요예산 부족 ⇨ 예산 추가확보 필요
  - ※ 강원랜드 영업중단으로 인한 폐광기금 감소로 재원확보 차질 우려
- (대응방안) 신축예산 군비부담 가중에 따른 국비지원 방안 강구

## □ 추진계획

- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 설계용역 완료 : 2021. 02월
- 계약심사 및 업체선정 : 2021. 03 ~ 04월
- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 공사착공 : 2021. 05월
- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 공사준공 : 2022. 12월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,700	0	0	0	2,300	12,400	1,000
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	600	0	0	0	600	0	0
폐기금	15,100	0	0	0	1,700	12,400	1,000
