

추진부서(팀)	건설과(재해예방팀)	이행도	정상추진
---------	------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 신동읍 예미리 산23-2번지 일원
- 사업량 : 터널 L= 1.1km, 접속도로 L= 1.1km
- 총사업비 : 39,856백만원
- 사업기간 : 2021년 1월 ~ 2025. 12월

〈現 도수터널 개요〉

- ▶ 용 도 : 지방상수도 도수 터널 (동강 ⇨ 신동읍)
- ▶ 규 모 : 연장 L=680m
- ▶ 설치년도 : 1985년

□ 추진현황


- 2016. 05. : “정선군 자연재해저감 종합계획 수립” 착수
 - ▶ 풍수해저감 종합계획 세부수립기준(2016.12.19. 국민안전처) 4차 개정
- 2019. 03. : 위험지구 및 관리지구 선정, 투자우선순위 결정
 - ▶ 투자우선순위 2순위(69개소 중)
- 2019. 06. : 관련 실과소 협의 및 정선군 의회 사전보고
- 2019. 07. : “자연재해저감 종합계획” 주민공청회 및 의견청취
- 2020. 04. : 행정안전부 협의(6차 1차 2019.11.~2020.7.)
- 2020. 08. : 예미 자연재해 위험개선지구 지구지정
- 2020. 09. : 예미 자연재해 위험개선지구 사업확정
- 2020. 11. : 일상감사 및 계약심사
- 2021. 01. : 기본 및 실시설계 용역 추진방침
- 2021. 04. : 사업수행능력 평가
- 2021. 05. : 용역 착수

□ 향후 추진계획

- 2021. 10 : 행정안전부 사전 심의 실시
- 2022. 06 : 공사 착공

사업대상지 위치도 및 전경

○ 계획평면

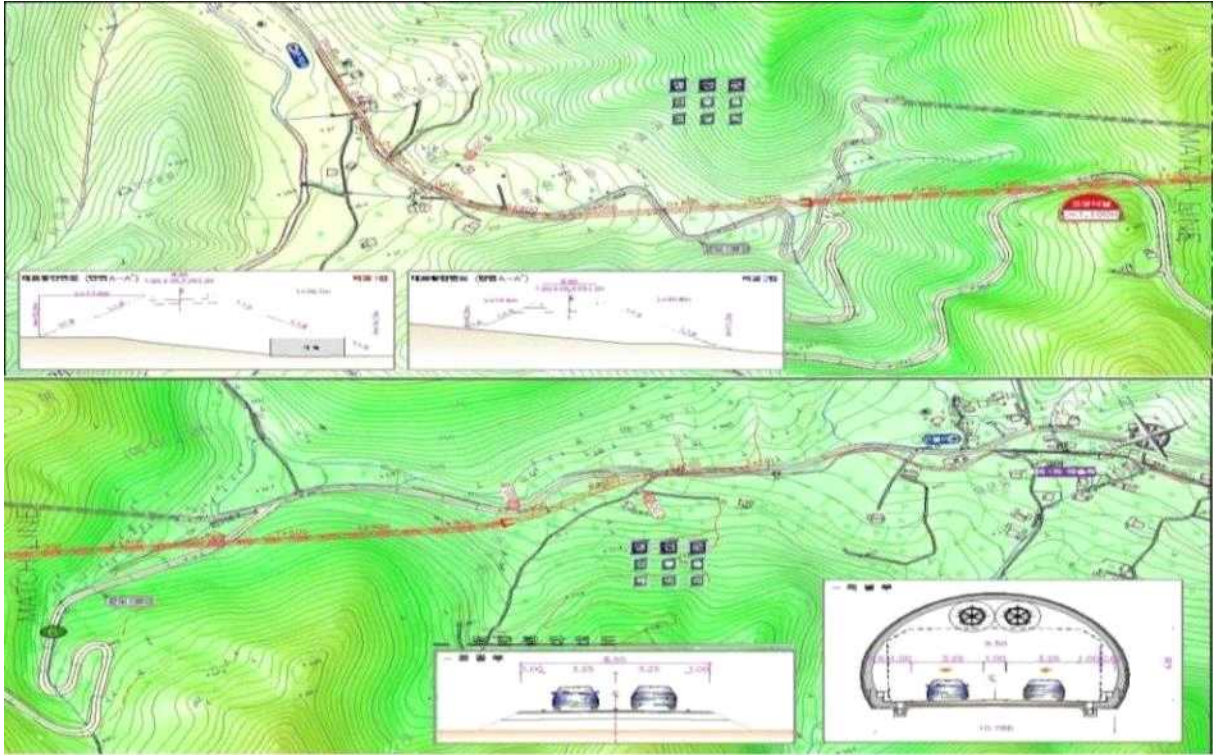

○ 전경사진

