

## 신동읍 예미-고성터널 확장

추진부서(팀)	재해예방	이행도	정상추진
---------	------	-----	------

### □ 사업개요

- 위 치 : 신동읍 예미리 산23-2번지(고성 도수터널) 일원
- 유형 및 등급 : 고립위험지구 /“가”등급 /(지정면적 : 3.7ha)
- 사업량 : 도로개설 L=1.1km, 터널개설 L=1.1km
- 총사업비 : 30,200백만원(시설비, 보상비, 기타)

### □ 추진현황

- 자연재해위험 개선지구 신규 지정 대상지 제출 : 2020. 4. 25.
- 중앙전문가 및 행정안전부 현장 방문 : 2020. 4. 23.
- 도 전문가 현지방문 : 2020. 4. 28
- 예미지구 지구지정 검토결과 통보 : 2020. 6. 7.
  - 지구지정 타당성 : 동절기시 주민들이 680m의 일방향 도수터널을 이용하고 있는 실정으로 고립지구 지정 타당.

### □ 추진계획

- 자연재해위험지구(대설/고립) 지정 1차 심의 : 2020. 7. 1.
- 자연재해저감 종합계획 승인 : 2020. 08월
- 자연재해위험지구(대설/고립) 전문위원 최종 심의 선정 : 2020. 10월
- 예미 자연재해저감개선지구 지정 고시 : 2020. 12월
- 사업추진 및 준공 : 2021년 ~ 2025년


### □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	30,200					1,000	29,200
국비	14,600						14,600
도비	2,920						2,920
군비	12,680					1,000	11,680

## 사업대상지 위치도 및 전경

○ 계획평면

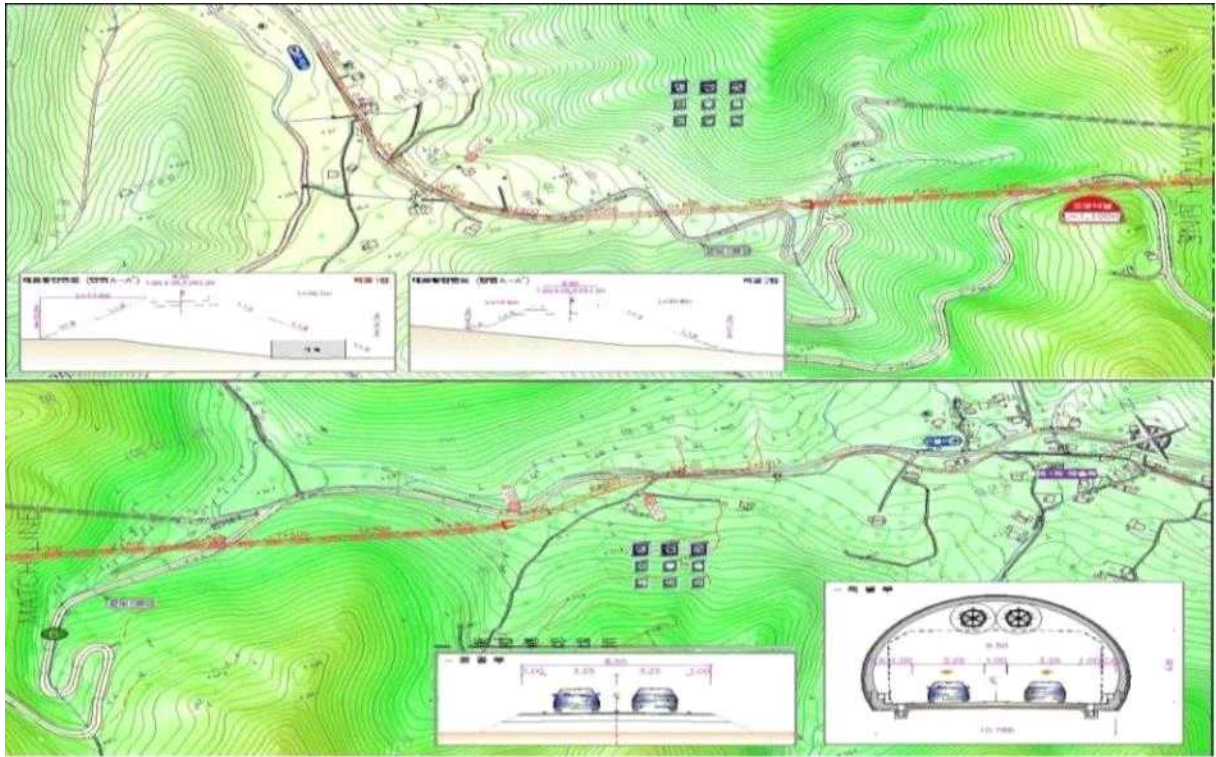

○ 전경사진

