


사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	건설과 토목팀	담당자	김동선 2485
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 신동읍 고성리 외 2개리 지역 주민 464명, 방문객 연 52,000여명이 신동읍 소재지 이동을 위하여 급경사 급커브 도로를 이용
- 겨울철 대설시 고립발생(4개월/9회) 예방을 위한 터널 개설로 고립 및 생활불편 해소

1. 사업개요

- 위 치 : 신동읍 예미리 산23-2번지 일원(군도6호)
- 사 업 량 : 터널개설L=740m, 접속도로L=970m
- 사 업 비 : 33,513백만원(국비 16,756 / 지방비 16,757)
- 사업기간 : '24년 ~ '28년
- 시 공 자 : 대저건설(주)

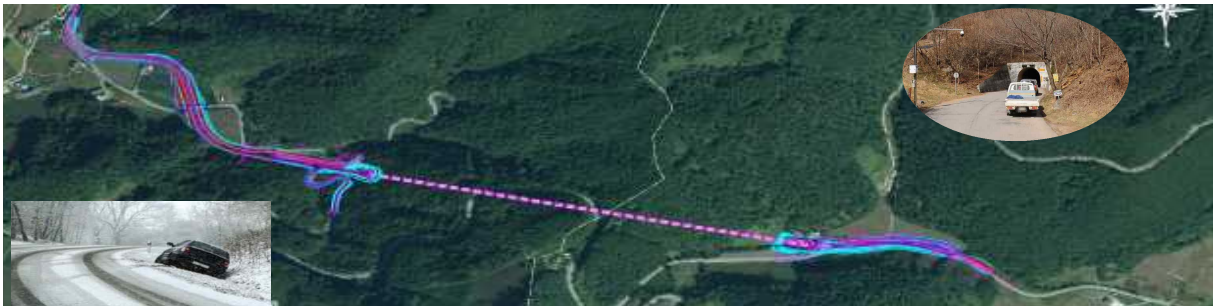

2. 추진현황

- 사업착공 및 기공식 : '24. 10월
- 손실보상 추진 : '25. ~

3. 추진계획

- 별개제근 및 부채도로, 현장사무실 설치 : '25. 6월
- 사업준공 : '28. 5월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'24	'25	'26	'27	'28
계	33,513	1,660	31,853	1,000	2,574	13,000	13,000	2,279
국 비	16,757	830	15,927	500	1,137	6,500	6,500	1,290
도 비	8,180	217	7,963	250	568	3,250	3,250	645
군 비	8,576	613	7,963	250	869	3,250	3,250	344
